

**Ministério das Cidades  
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental**

# **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**Comissão Mista do Orçamento**

**Drenagem nas bacias dos córregos Canela e  
Borá – São José do Rio Preto/SP**

**Brasília, 28 de novembro de 2012**



**Ministério das Cidades  
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental**

**Ministério das Cidades**  
**Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental**

**PAC - DRENAGEM NAS BACIAS DOS CÓRREGOS CANELA E BORÁ – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP**

**INVESTIMENTOS CONTRATADOS**


<b>Contrato</b>	<b>Fonte</b>	<b>Assinatura do Contrato</b>	<b>Situação da Obra</b>	<b>Valor de Repasse/ Empréstimo</b>	<b>Valor de Contrapartida</b>	<b>Valor de Investimento</b>
351000-11	OGU	19/08/2011	Não Iniciada	R\$ 59.505.290,00	R\$ 1.226.249,18*	R\$ 60.731.539,18
347540-60	FGTS	31/01/2012	Não Iniciada	R\$ 65.771.740,00	R\$ 6.490.382,69*	R\$ 72.262.122,69
<b>Total de Investimento</b>						<b>R\$ 132.993.661,87</b>

\* Valores sujeitos a alterações e possíveis retificações de orçamento e/ou alteração do valor do PTTS (Fonte: Prefeitura)

# Ministério das Cidades

## Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental


PAC - IMPLANTAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

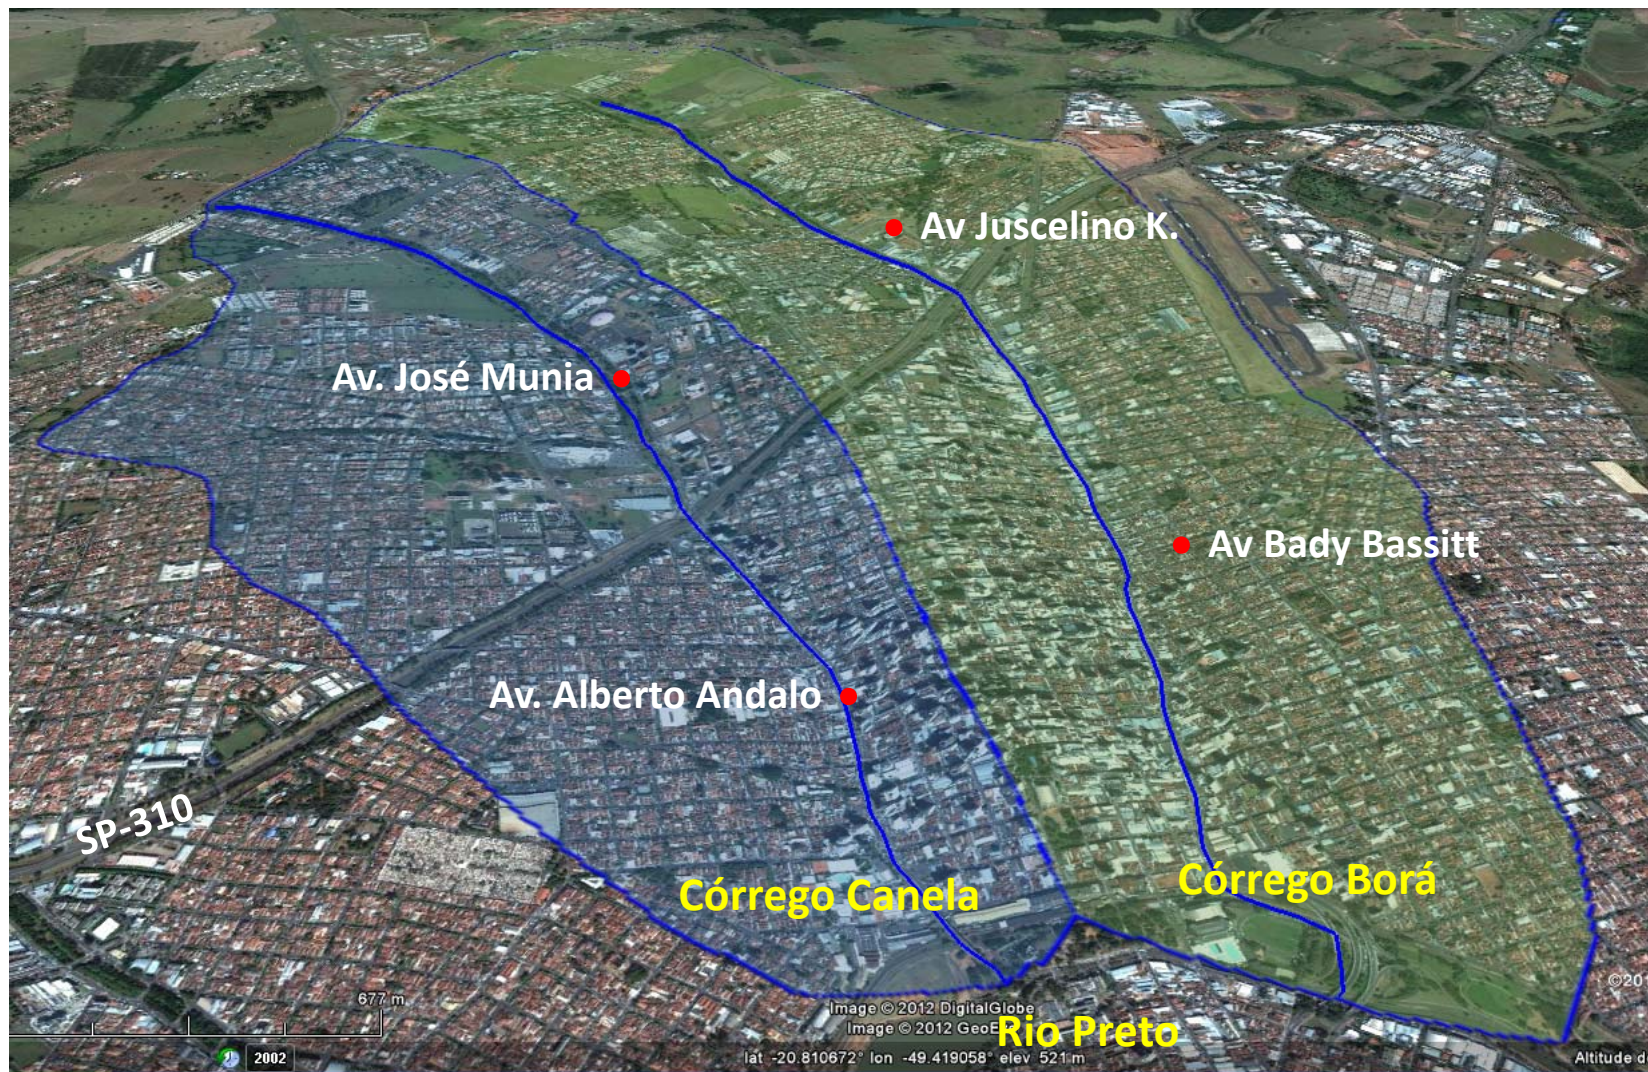

# Ministério das Cidades

## Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental


### PAC - IMPLANTAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

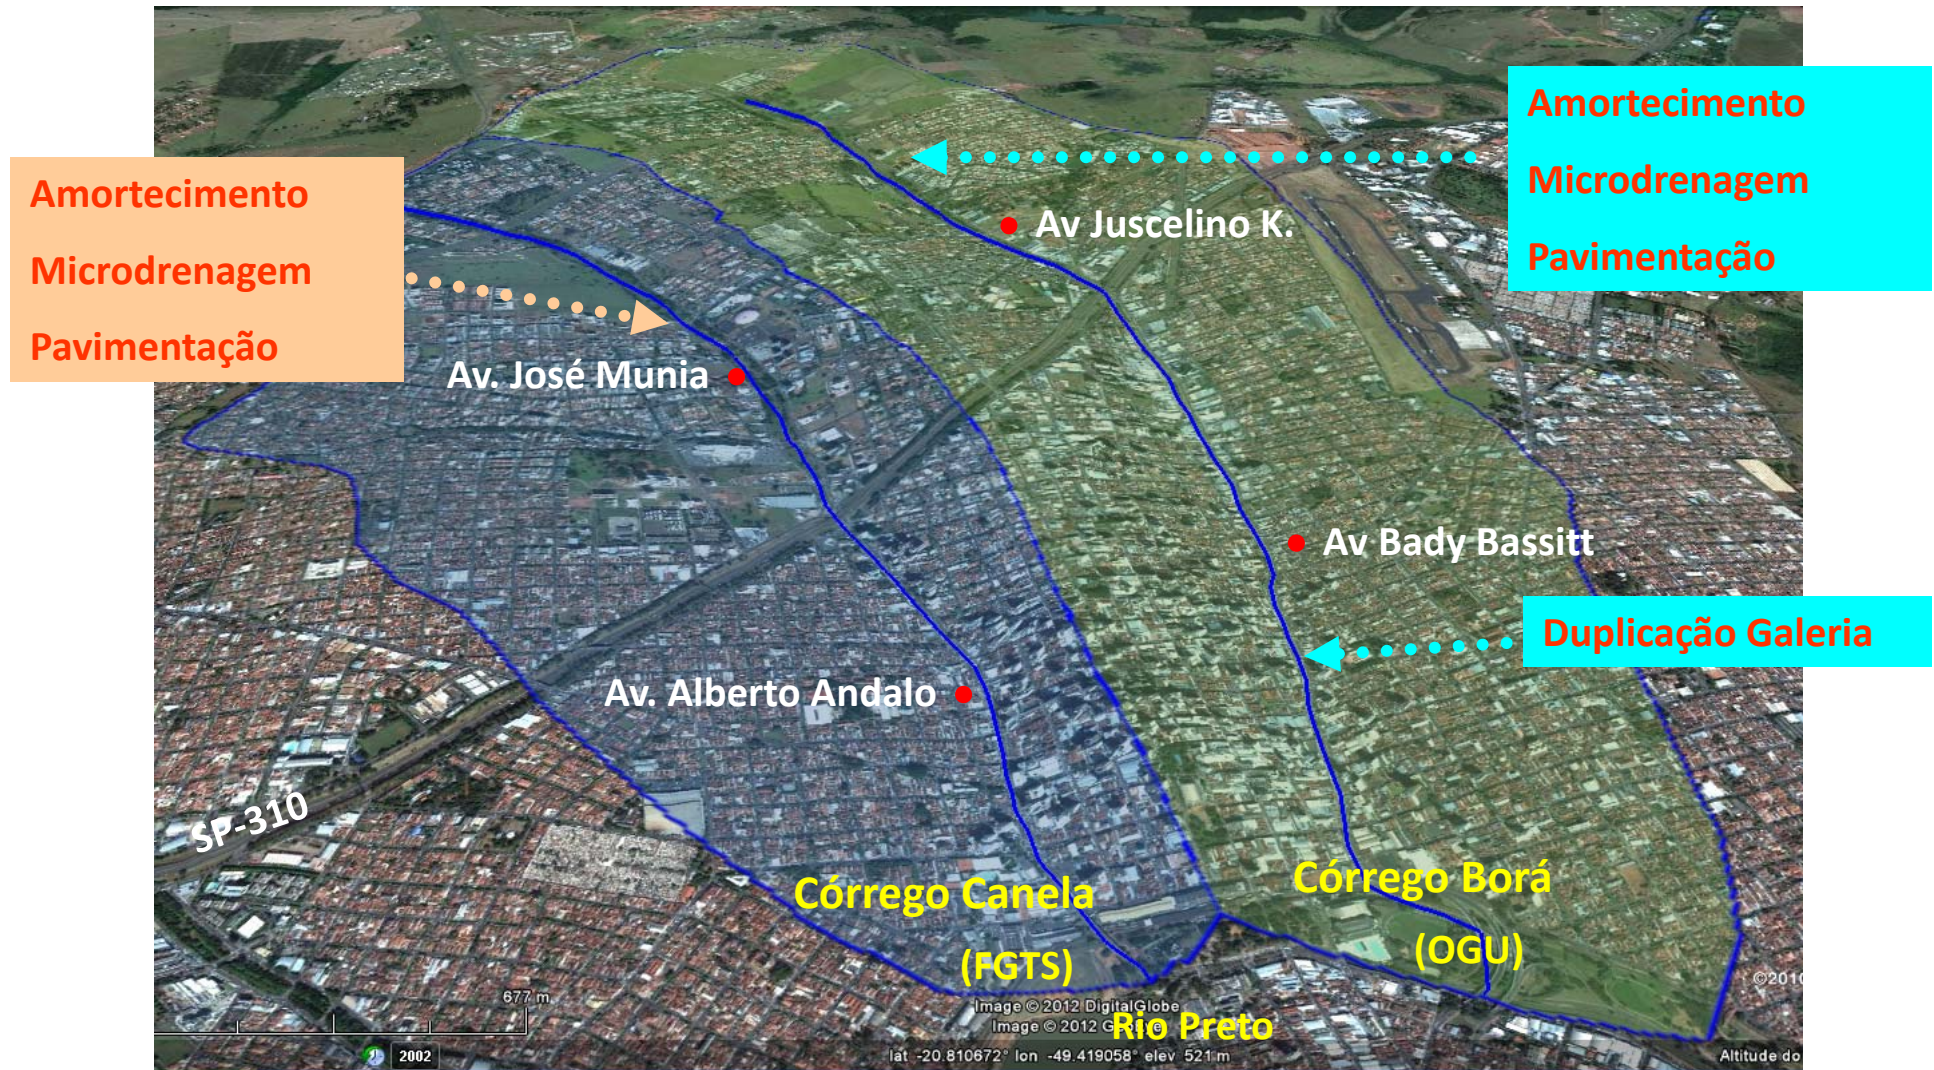

# Ministério das Cidades

## Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental


### PAC - IMPLANTAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

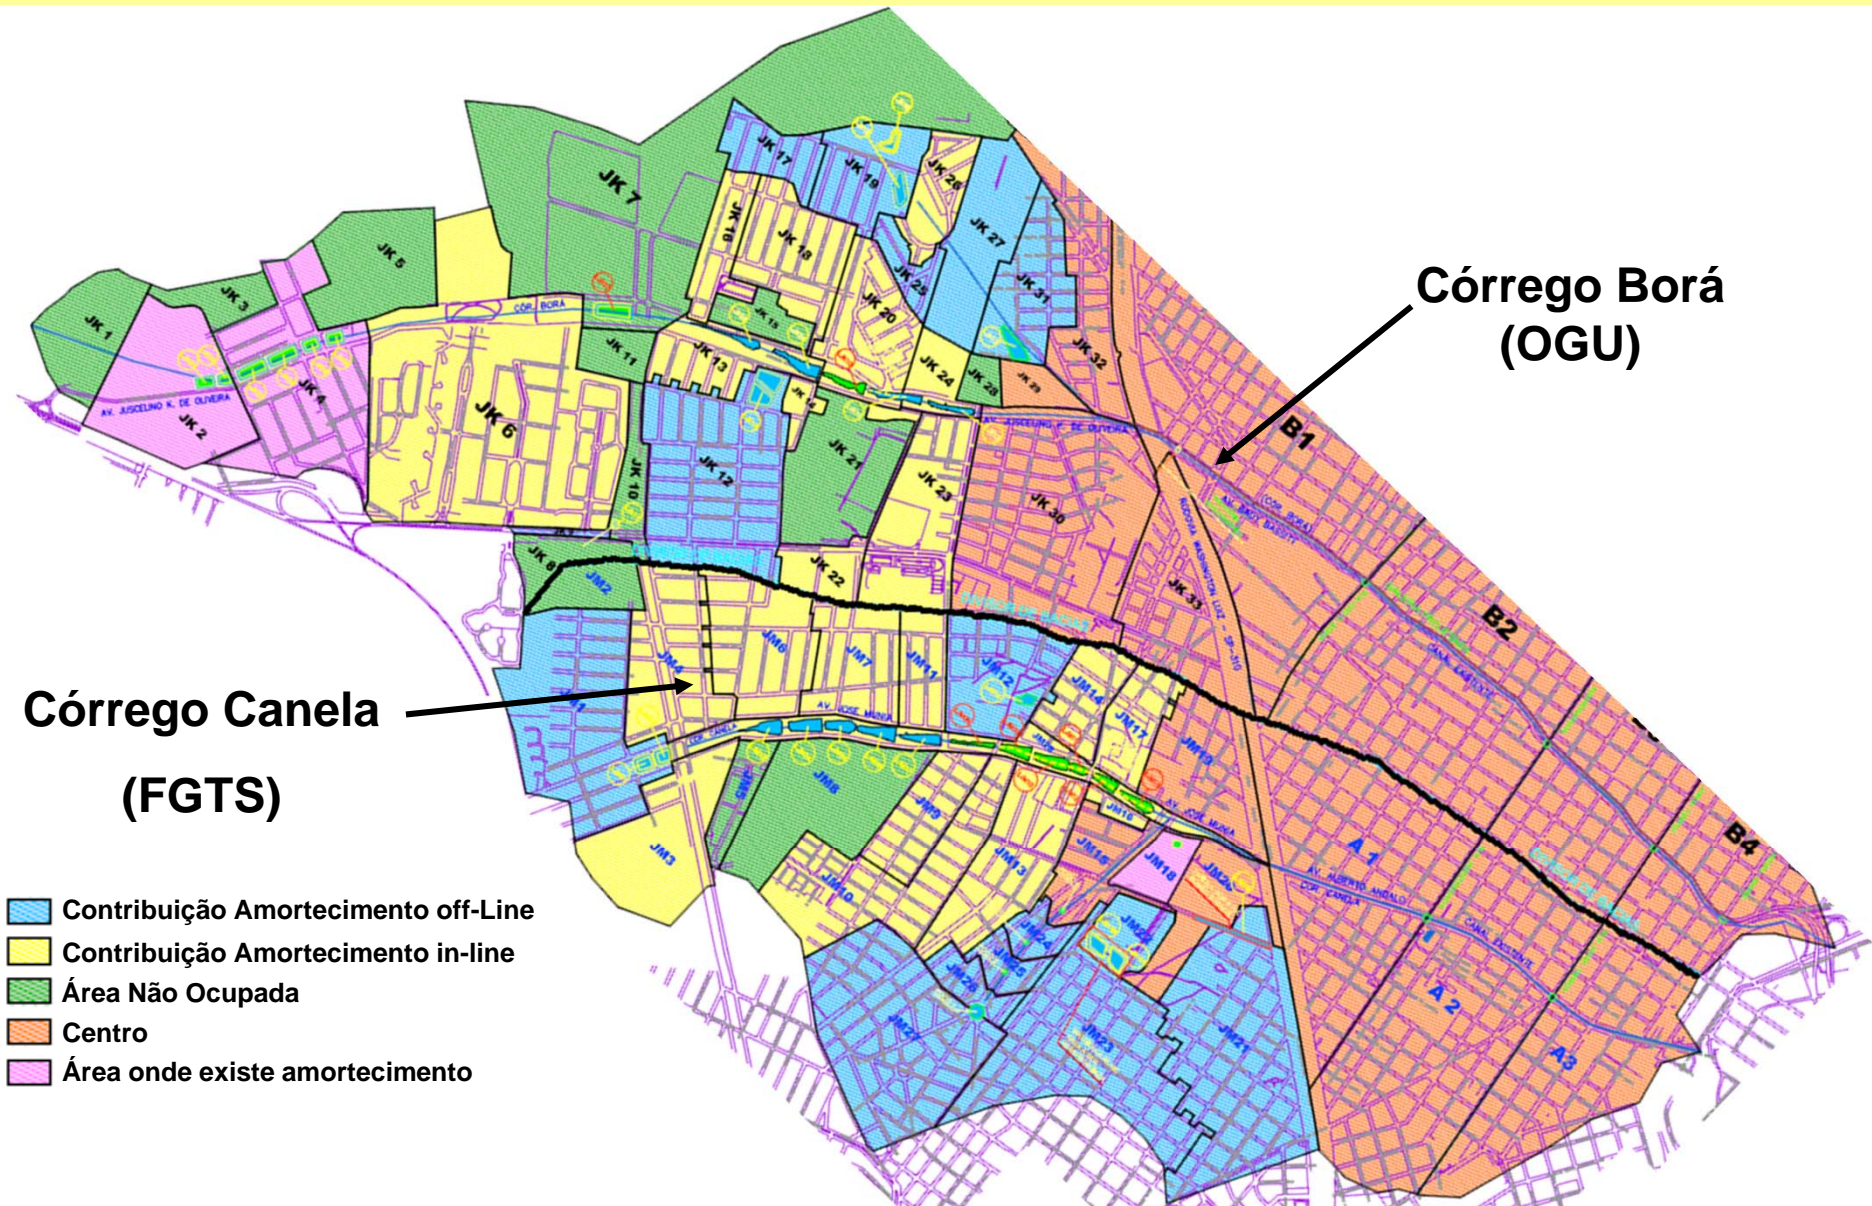

# Ministério das Cidades

## Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental


### PAC - IMPLANTAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

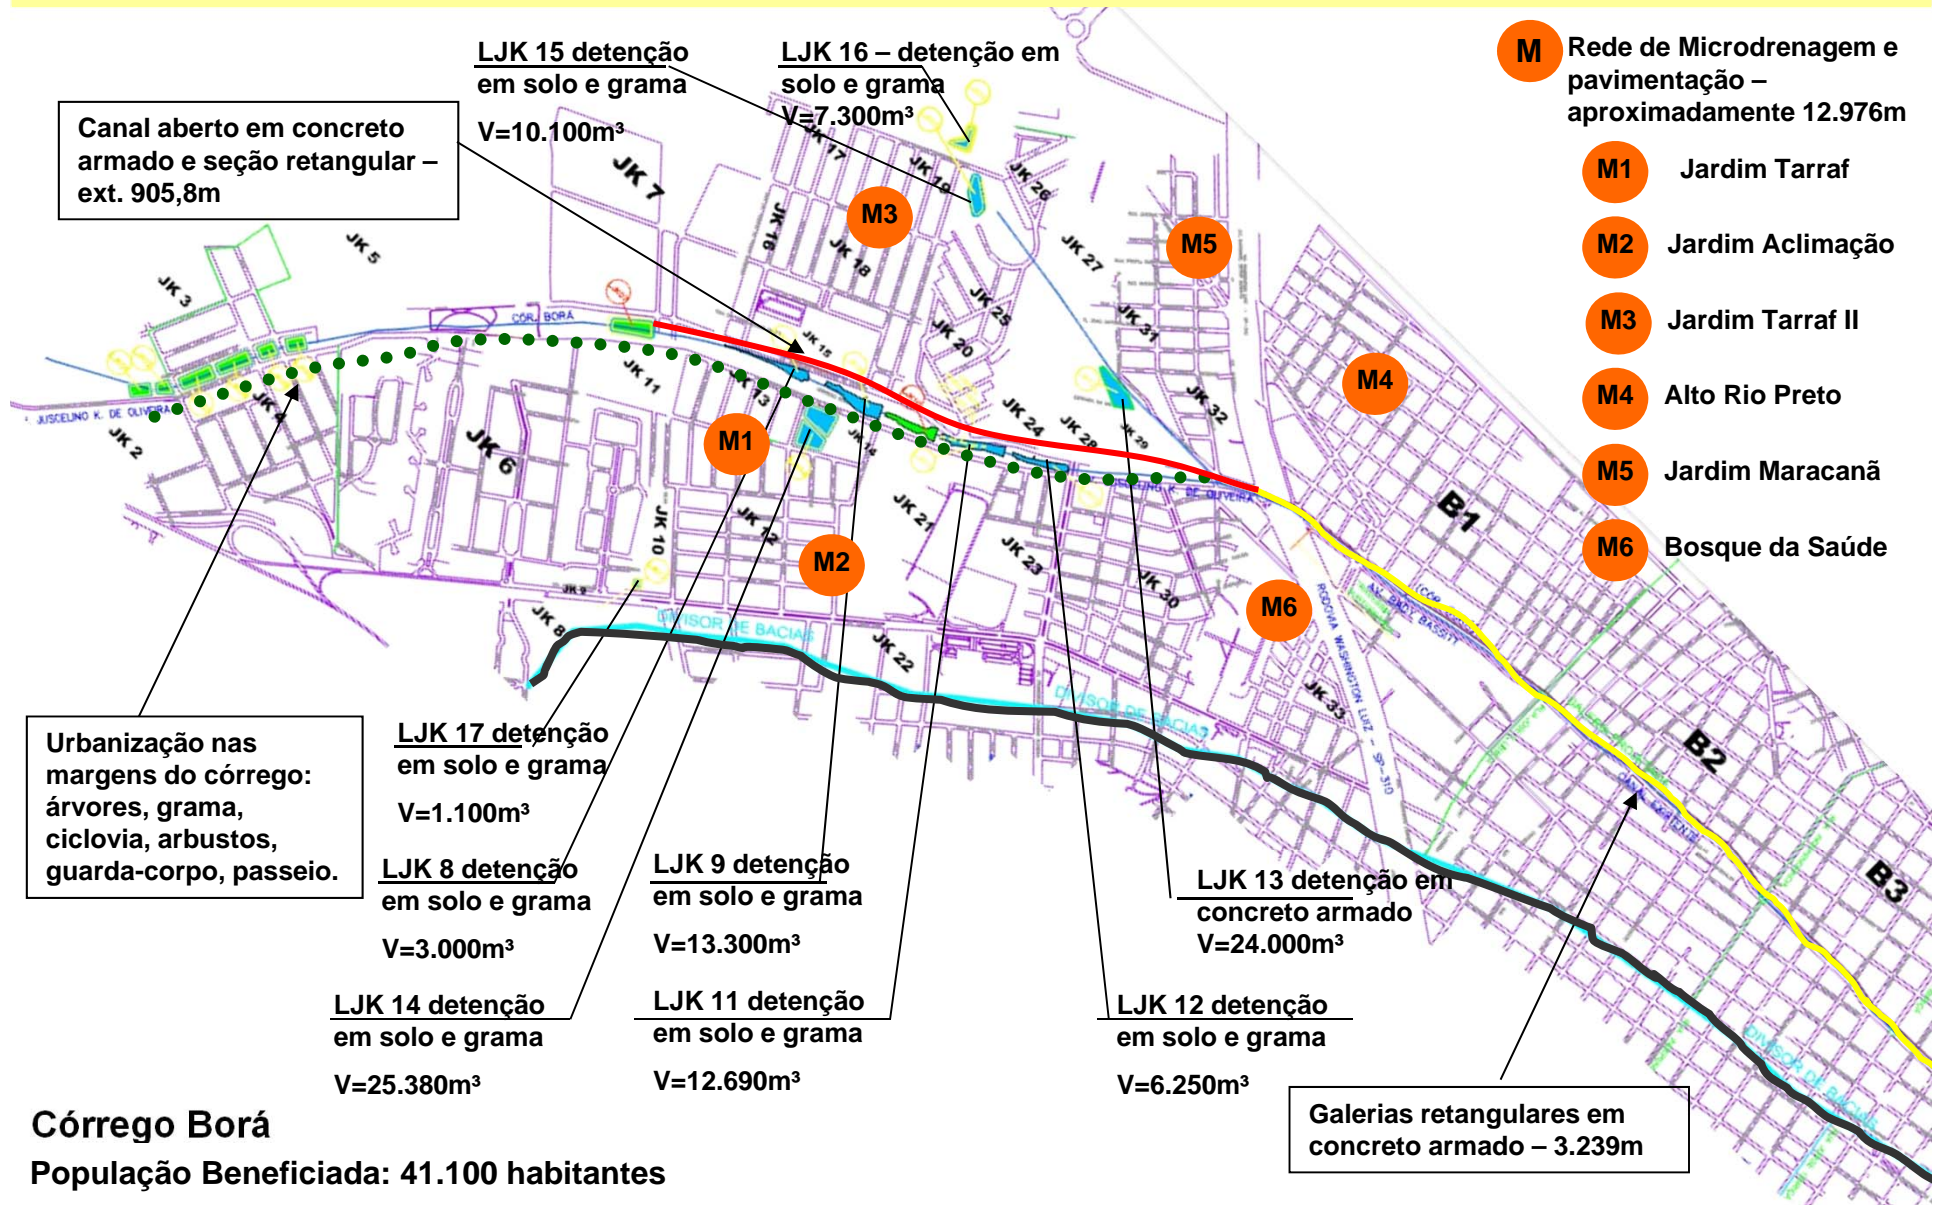

# Ministério das Cidades

## Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

### PAC - IMPLANTAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

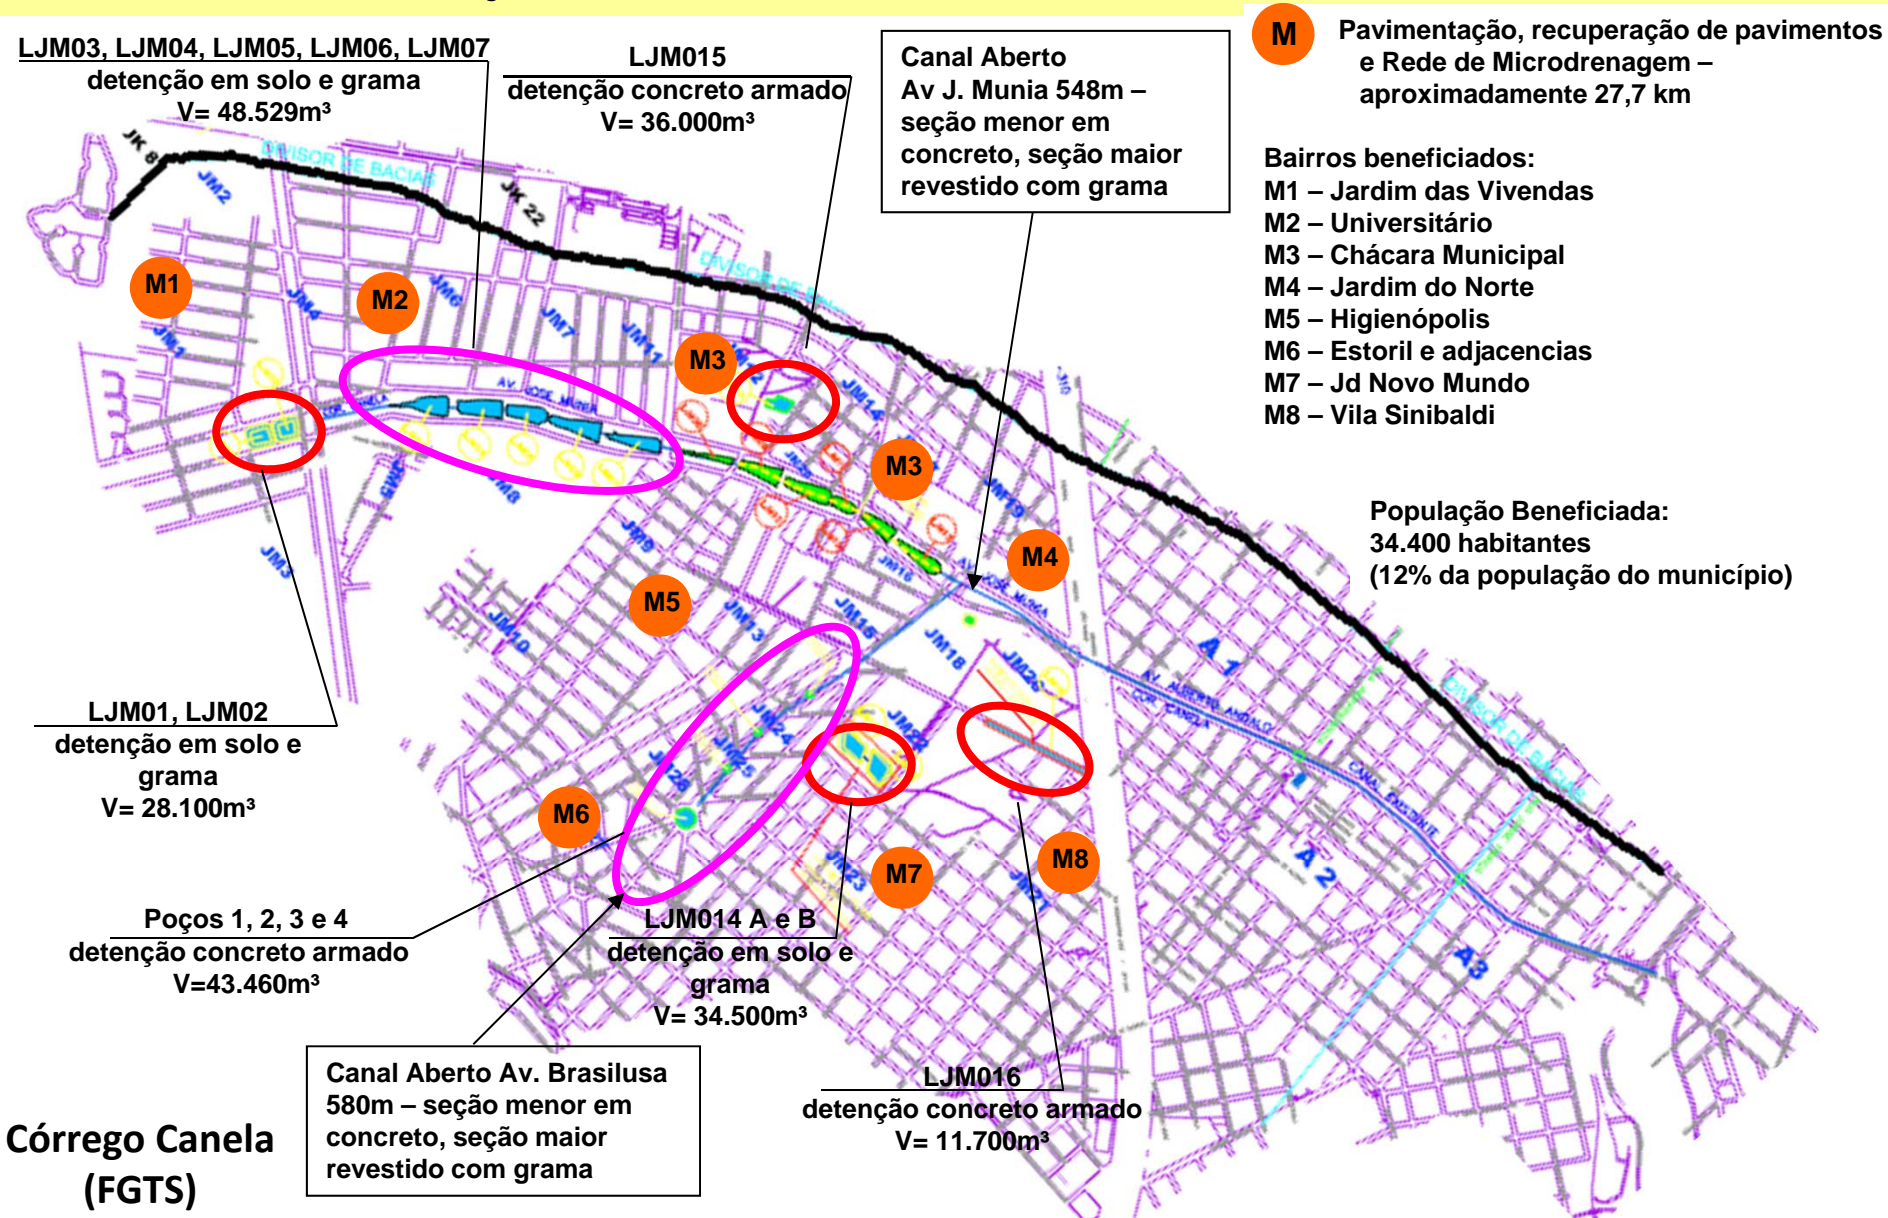

# Ministério das Cidades

## Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

### OBJETIVOS DOS EMPREENDIMENTOS



Bacia do Córrego Borá – Av. Bady Bassitt – jan/2010

Fonte: diárioweb.com.br



Bacia do Córrego Borá – Av. Bady Bassitt – jan/2010

Fonte: Prefeitura de São José do Rio Preto



Bacia do Córrego Borá – Av. Bady Bassitt – jan/2010

Fonte: Prefeitura de São José do Rio Preto



Bacia do Córrego Borá – Av. Bady Bassitt – jan/2010

Fonte: diárioweb.com.br

# Ministério das Cidades

## Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

### OBJETIVOS DOS EMPREENDIMENTOS



# Ministério das Cidades

## Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

### OBJETIVOS DOS EMPREENDIMENTOS



# **Ministério das Cidades**

## **Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental**

### **AUDITORIA DO TCU - Acórdão 2.382/2011- Plenário**

- **Relatório nº 352/2012: Objetivo de fiscalizar o edital de Pré-Qualificação 001/2012 da Prefeitura de São José do Rio Preto/SP para contratação de obras de drenagem nas bacias dos córregos Canela e Borá.**

#### **a) Constatações do Relatório:**

**3.1 – Projeto básico deficiente ou desatualizado;**

**3.2– Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado;**

**3.3 – Restrição a competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento;**

- **Acórdão 1705/2012- TCU – Plenário - “As justificativas apresentadas não foram suficientes para elidir os indícios de irregularidade apontados”.**

#### **• Determinações:**

**9.1d) – À Prefeitura: refazer a respectiva licitação e analisar a viabilidade de atender à sugestão do Ministério das Cidades de se proceder à divisão do objeto da licitação realizando certames distintos para os objetos dos contratos 0351000-11 (OGU) e 0347.540-60 (FGTS);**

**9.2.3 – Ao Ministério das Cidades que não homologue a Síntese do Projeto Aprovado (SPA, até que haja decisão de mérito definitiva acerca dos indícios de irregularidades tratados nos presente processo**

**Ministério das Cidades**  
**Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental**

**PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA SNSA/MCIDADES**

- **Contrato 351000-11 (OGU)**

Suspendeu a homologação da SPA pelo MCidades até que haja decisão de mérito definitiva do TCU.

Encaminhou os Ofícios n. 854 e 1107 à Prefeitura instando-a a adotar as providências necessárias para sanear os apontamentos realizados pelo TCU.

Encaminhou os Ofícios n. 852 e 1106 à CAIXA solicitando providências para esclarecer a conduta da mandatária e para acompanhar as providências adotadas pela Prefeitura para esclarecer ou sanear os apontamentos do TCU.

- **Contrato 347540-60 (FINANCIAMENTO)**

Sugeriu que a Prefeitura realizasse nova licitação mediante processos licitatórios distintos para os objetos dos contratos 0347540-60 e 0351000-11.

Foram encaminhados os Ofícios n. 886 e 1195 à Prefeitura de São José do Rio Preto/SP para conhecimento e manifestação acerca do Relatório n. 352/2012/2011-TCU e Acórdão n. 1705/2012/2011-TCU, respectivamente.

Foram encaminhados os Ofícios n. 885 e 1196 à CAIXA para conhecimento e providências acerca do Relatório n. 352/2012/2011-TCU e Acórdão n. 1705/2012/2011-TCU, respectivamente.

**Ministério das Cidades**  
**Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental**

**PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO /SP**

- Em 25 de agosto – Prefeitura apresentou nova versão do projeto básico, complementado e alterado, ao TCU – 3ª SECOB, com vistas a atender as falhas indicadas no item 9.1.a do Acórdão.
- Em 12 de novembro, a Prefeitura:
  - reapresentou os orçamentos das obras, refeitos para alterar e adequar os preços unitários dos itens em que foram detectados os indícios de sobrepreço e as quantidades da planilha que se encontravam divergentes das observadas no projeto básico.
  - apresentou documento técnico justificando as razões pela qual considerava desnecessário o cancelamento da fase de pré-qualificação do certame licitatório e solicitou revisão do posicionamento da corte de contas.
  - reapresentou o projeto de engenharia atualizado e complementado à CAIXA para continuidade da análise

**Ministério das Cidades**  
**Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental**

**CONCLUSÕES DA NOVA ANÁLISE REALIZADA PELA 3ª SECOB - TCU**

- Em 16 de novembro, 3ª SECOB – TCU emitiu Relatório de Auditoria TC 008.503/2012-5 esclarecendo que:
  - O projeto básico foi complementado e alterado, restando, pois, cumprida a medida corretiva descrita no item 9.1.a do Acórdão.
  - As alterações nos preços unitários e nas quantidades da planilha orçamentária foram suficientes para sanear todos os indícios de sobrepreço detectados.
  - As medidas corretivas (item 9.1.c e 9.1.d do Acórdão) não foram implementadas, pois a Prefeitura não refez a licitação nem anulou a Pré-Qualificação 001/2012.
  - Mesmo assim, como as propostas de preços não haviam sido entregues, entendeu que poderia ser preterida a anulação da pré-qualificação desde que:
    - seja fornecido às licitantes o novo projeto básico e a nova planilha orçamentária e
    - reiniciado prazo para que as empresas elaborem suas propostas de preços

**Ministério das Cidades  
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental**

**POSIÇÃO ATUAL DA 3ª SECOB - TCU**

**A principal proposta de encaminhamento definidas pelo TCU foi:**

**“(i) comunicar ao Congresso Nacional que o indício de irregularidade grave do tipo IG-P (projeto básico deficiente) foi saneado**

**CONCLUSÃO DA SNSA/MCIDADES**

**SOLICITAR À COMISSÃO MISTA DO ORÇAMENTO QUE:**

- Acate a recomendação da 3ª SECOB – TCU e**
- Não inclua a Macrodrenagem do Córrego Borá em São José do Rio Preto na relação de obras com vedação de recebimento de recursos da União em 2013**

**Ministério das Cidades  
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental**

**Obrigado !**

**Manoel Renato Machado Filho  
Diretor**

**[manoel.renato@cidades.gov.br](mailto:manoel.renato@cidades.gov.br)**

**Telefone: 61 – 2108 1973/1684**

