

**Fiscalizações do TCU nas obras da
REFINARIA ABREU E LIMA
Refinaria do Nordeste - Rnest**

Seinfra Operações

Brasília, novembro de 2017


TC 008.472/2008-3

Secretaria Extraordinária de
Operações Especiais em Infraestrutura
Seinfra Operações

Refinaria

ABREU E LIMA



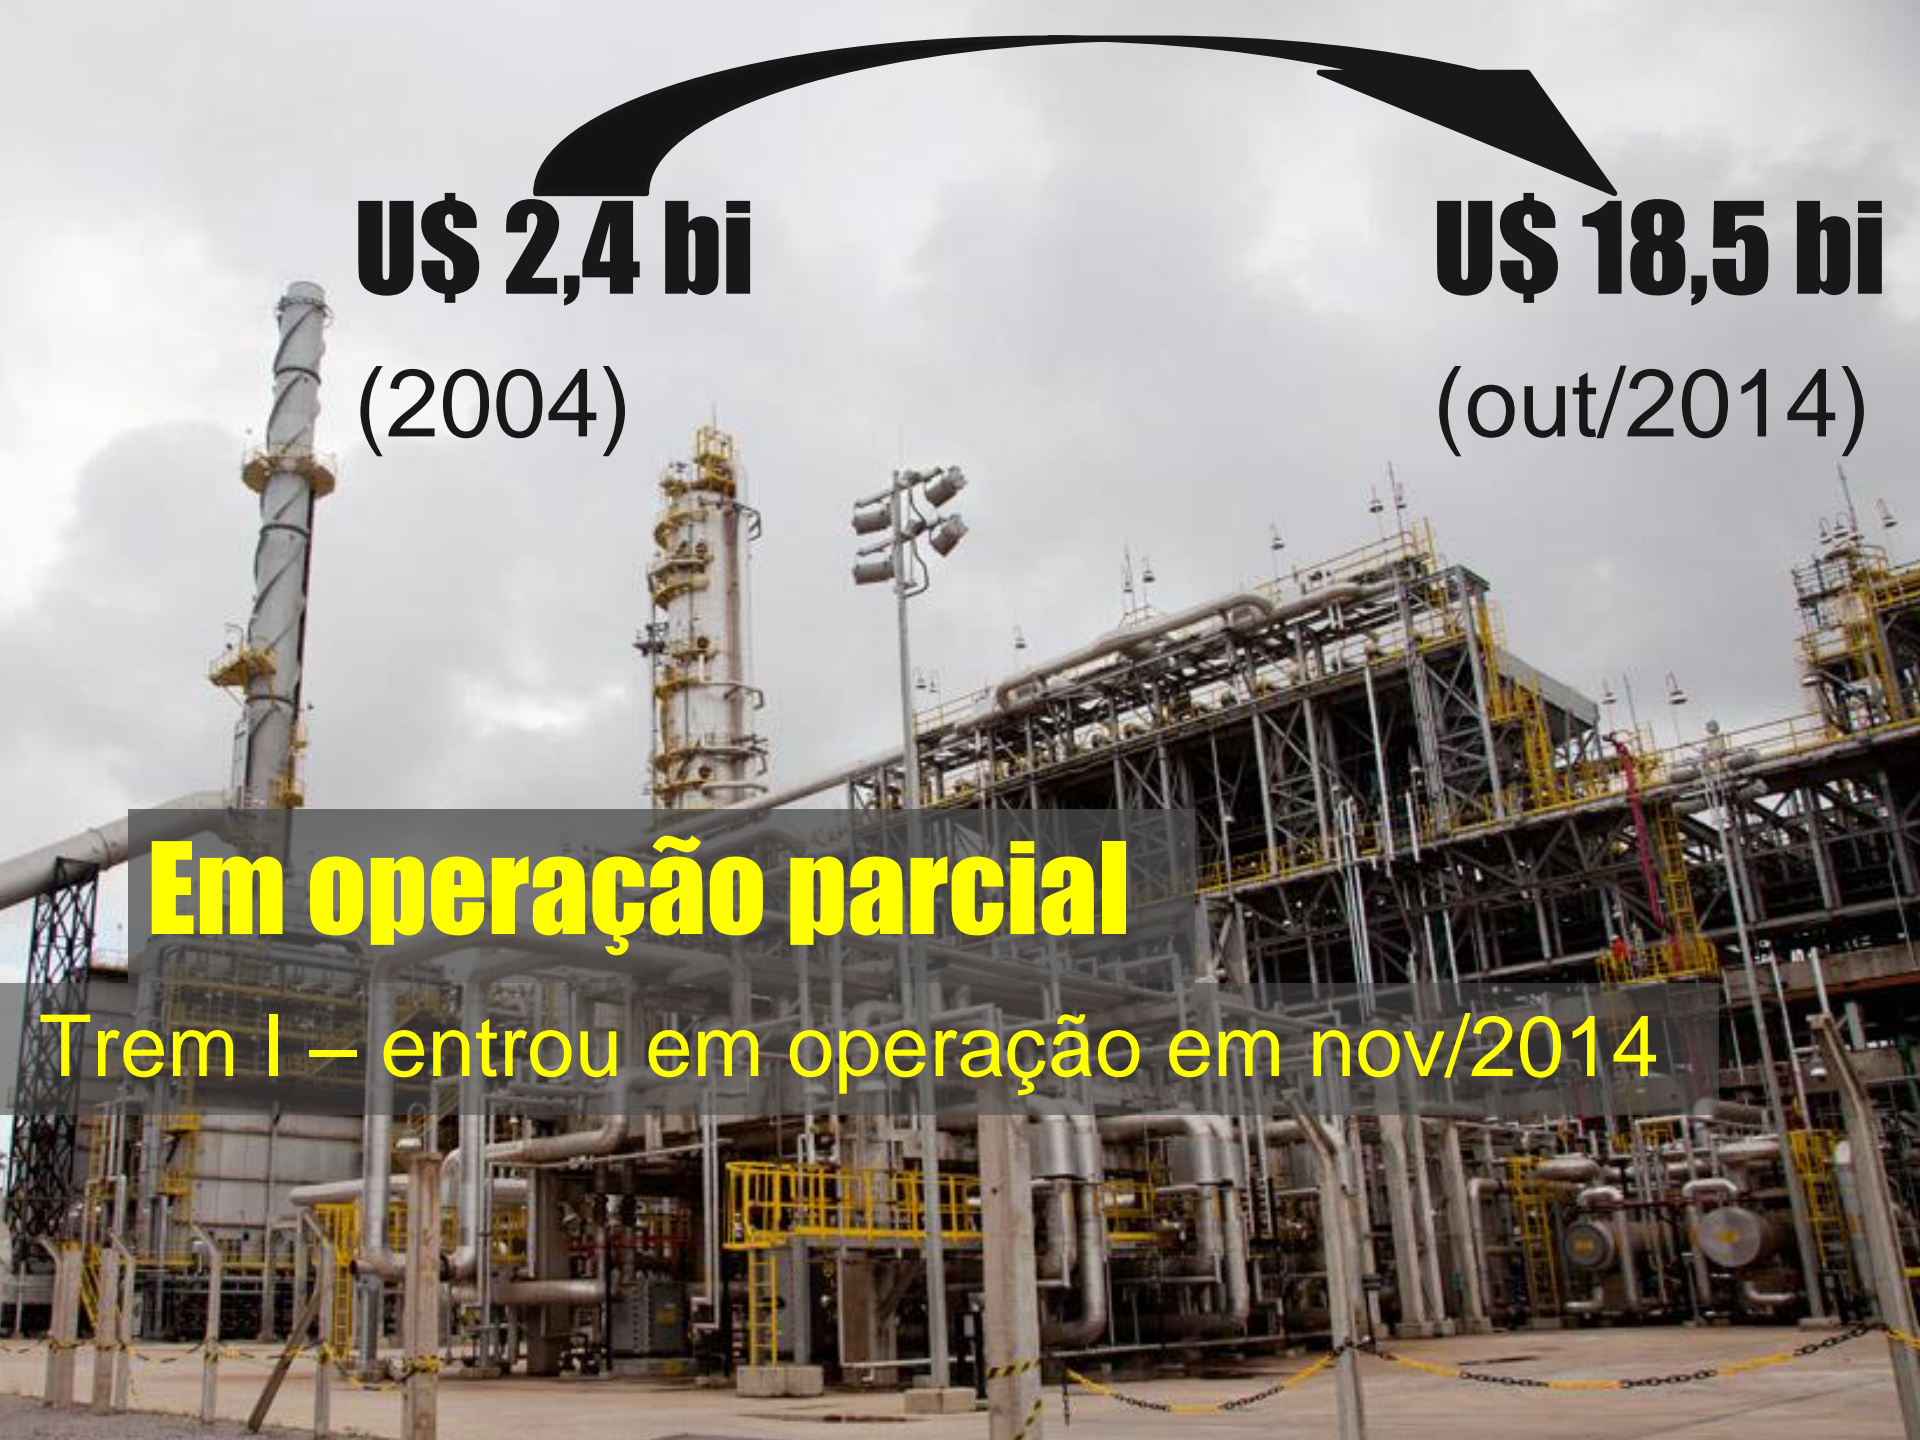

US\$ 2,4 bi

(2004)

US\$ 18,5 bi

(out/2014)

Em operação parcial

Trem I – entrou em operação em nov/2014

A complex network diagram representing the 'Operação Lava Jato' investigation. It features numerous circular nodes, each containing a portrait of an individual. These nodes are interconnected by a web of thin lines, suggesting relationships between the individuals. Some nodes are highlighted with colored backgrounds (e.g., red for 'PRESO', blue for 'PP', green for 'PMDB'). Text labels are scattered throughout the network, including 'DENUNCIADO', 'POLÍTIOS', 'KALVÃO ENGENHEIRA', 'UTC CONSTRAN', 'COBRECHT', 'PROMON', 'STANKA', 'EMPREITEIRAS', 'OBRAS', 'MENDES JÚNIOR', 'ANDRACE BUTERREZ', 'PETROBRÁS', 'CONDENADO', 'DELAÇÃO', and 'PT'. A thick white horizontal bar is positioned above the main title. The title itself is rendered in large, bold, white capital letters with a tilde (~) over the 'Ç' and a subscript '3' under the 'S'.

OPERAÇÃO LAVA JATO

OPERAÇÃO LAVA JATO

~~-----Mensagem original-----~~

~~De: Rogerio Araujo [mailto:raraujo@odebrecht.com]~~

~~Enviada em: segunda-feira, 18 de junho de 2007 15:22~~

~~Para: Paulo Falcao Correa Lima Filho~~

~~Cc: Joao Antonio Pacifico Ferreira~~

~~Assunto: Terraplenagem .~~

P. Falcão,

O orçamento interno do Cliente esta na faixa de 150 à 180 M Reais, o que obviamente não dá! Já falei com vários interlocutores e Engenharia está trabalhando na Revisão do Orçamento . Mencionei que o número do mercado é mais do que o dobro deste valor.

A revisão do orçamento vai indicar um novo número, acima dos indicados acima. De qualquer forma, temos que trabalhar num orçamento sem excessos, caso contrários correremos o risco de cancelamento da licitação. O Cliente solta somente no dia da abertura das propostas (a idéia é na linha de não haver adiamento) o preço médio que poderá variar cerca de + ou - 10% ou +ou - 20% (índices de dispersão). Caso o nosso preço venha com valor acima de 30%, os preços são considerados abusivos e a licitação poderá ser cancelada.

O Cliente tem como meta iniciara ainda em julho os serviços de terraplenagem e cerimônia que contará com a presença do pres.Lula.

Abs, RA.

Figura 1 – Trecho de e-mail obtido no caminho “/img_ITEM 07-ITEM ARRECADACAO 18.E01/BKP BIA/Disco D/Documents/Correio/Microsoft_Outlook/backup_2000.pst>>>>Pasta particular superior>>Itens enviados>>RES: Terraplenagem (up date 27/07)” (a íntegra do arquivo acha-se impressa no Apêndice A – arquivo 01).

Obtenção de informações prévias e privilegiadas

-----Mensagem original-----

De: Rogerio Araujo [mailto:raraujo@odebrecht.com]

Enviada em: segunda-feira, 18 de junho de 2007 15:22

Para: Paulo Falcao Correa Lima Filho

Cc: Joao Antonio Pacifico Ferreira

Assunto: Terraplenagem .

O orçamento interno do Cliente esta na faixa de 150 à 180 M Reais, e

com vários interlocutores e Engenharia esta trabalhando na Revisão do Orçamento . Mencionei que o numero do mercado é mais do que o dobro deste valor.

A revisão do orçamento vai indicar um novo número, acima dos indicados acima. De qualquer forma, temos que trabalhar num orçamento sem excessos, caso contrários correremos o risco de cancelamento da licitação. O Cliente solta somente no dia da abertura das propostas (a idéia é na linha de não haver adiamento) o preço médio que poderá variar cerca de + ou - 10% ou +ou - 20% (índices de dispersão). Caso o nosso preço venha com valor acima de 30%, os preços são considerados abusivos e a licitação poderá ser cancelada.

O Cliente tem como meta iniciara ainda em julho os serviços de terraplenagem e cerimônia que contará com a presença do pres.Lula.

Abs, RA.

Figura 1 – Trecho de e-mail obtido no caminho “/img_ITEM 07-ITEM ARRECADACAO 18.E01/BKP BIA/Disco D/Documents/Correio/Microsoft_Outlook/backup_2000.pst>>>>Pasta particular superior>>Itens enviados>>RES: Terraplenagem (up date 27/07)” (a íntegra do arquivo acha-se impressa no Apêndice A – arquivo 01).

Majoração do valor da estimativa

-----Mensagem original-----

De: Rogerio Araujo [mailto:raraujo@odebrecht.com]

Enviada em: segunda-feira, 18 de junho de 2007 15:22

Para: Paulo Falcao Correa Lima Filho

Cc: Joao Antonio Pacifico Ferreira

Assunto: Terraplenagem .

P. Falcão,

O orçamento interno do Cliente esta na faixa de 150 à 180 M Reais, o que obviamente não dá! Já falei com vários interlocutores e Engenharia está trabalhando na Revisão do Orçamento . Mencionei que o número do mercado

A revisão do orçamento vai indicar um novo número, acima dos indicados acima.

Cliente solta somente no dia da abertura das propostas (a idéia é na linha de não haver adiamento) o preço médio que poderá variar cerca de + ou - 10% ou +ou - 20% (índices de dispersão). Caso o nosso preço venha com valor acima de 30%, os preços são considerados abusivos e a licitação poderá ser cancelada.

O Cliente tem como meta iniciara ainda em julho os serviços de terraplenagem e cerimônia que contará com a presença do pres.Lula.

Abs, RA.

Figura 1 – Trecho de e-mail obtido no caminho “/img_ITEM 07-ITEM ARRECADACAO 18.E01/BKP BIA/Disco D/Documents/Correio/Microsoft_Outlook/backup_2000.pst>>>>Pasta particular superior>>Itens enviados>>RES: Terraplenagem (up date 27/07)” (a íntegra do arquivo acha-se impressa no Apêndice A – arquivo 01).

Terraplenagem

R\$ 534 milhões

valor final do contrato

Auditoria 2008

R\$ 69 milhões

Sobrepçoço/ Superfaturamento

preços unitários acima dos valores referenciais

**Determinação
de retenção de
valores**

Análise conservadora

Superfaturamento –
Análise TCU

R\$ 69 milhões

Existe laudo da PF estimando
o sobrepreço neste contrato

R\$ 106 milhões

Ref. Laudo 0777/2015-SETEC/SR/DPF/PR

Retenção de Valores IG-R

Acórdão 3044/2008

- Reter dos pagamentos a diferença entre preços indicados e contratados
- A contratada pode oferecer garantias, alternativamente à retenção

R\$ 69 milhões

sobrepçoço

R\$ 50 milhões

já repactuados pela
Petrobras

R\$ 19 milhões

execução de garantias
Valor Atualizado supera

R\$ 31 milhões

Acórdão 2290/2013



Acórdão 2290/2013-Plenário

Agravo

Negado Ac. 488/2015-P

Reexame



Status Atual do Processo



IG-R: GARANTIAS

Galvão Engenharia

Recuperação judicial: **crédito concursal**

Camargo Corrêa

Penhora de bens móveis como forma de substituição ao seguro: um guindaste do fabricante Terex e duas guas torre do fabricante Liebherr

Queiroz Galvão

Penhora de bens móveis como forma de substituição ao seguro: dois tratores de esteiras D8T, uma escavadeira hidráulica 330 L, um guindaste HC 238H II, um guindaste RT -890E, uma escavadeira PC -138 US – 8 e uma carregadeira frontal de pneus 962H

Odebrecht

Penhora de bens móveis como forma de substituição ao seguro: um guindaste tipo torre modelo Liebherr 2000 HC 60 e uma usina de asfalto gravimétrica modelo Lintec CSD 3000

IG-R: GARANTIAS

Galvão Engenharia

PETROBRAS

Recuperação judicial: crédito concursal

RECUSOU ESSA

Camargo Corrêa

PROPOSTA E EXIGIU

NOVAS GARANTIAS

penhora de bens móveis, como forma de substituição ao seguro: duas gruas torre do fabricante Terex e duas gruas torre do fabricante Liebherr

Queiroz Galvão

VÁLIDAS ATÉ

30/11/2017

Penhora de bens móveis como forma de substituição ao seguro: dois tratores de esteiras DT, uma escavadeira hidráulica 330 L, um guindaste HC 238H II, um guindaste RT-890E, uma escavadeira PC-138 US-8 e uma carregadeira frontal de pneus 962H

Odebrecht

Penhora de bens móveis como forma de substituição ao seguro: um guindaste tipo torre modelo Liebherr 2000 HC 60 e uma usina de asfalto gravimétrica modelo Lintec CSD 3000

Perguntas?



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Seinfra Operações
