




MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL



**CANAL ADUTOR
DO SERTÃO ALAGOANO**



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

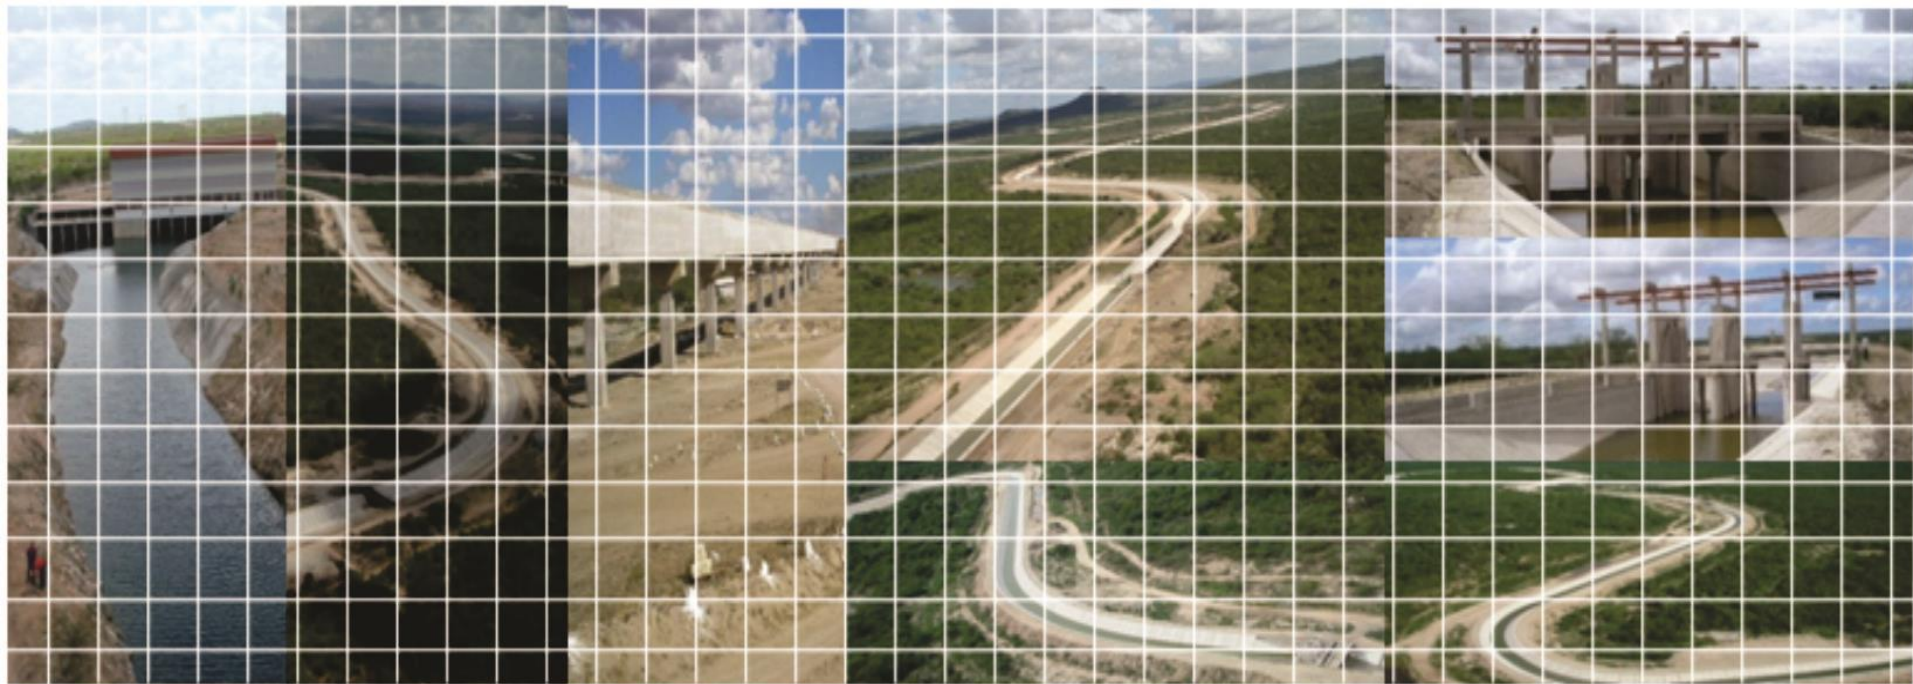

GOVERNO DO ESTADO



TRABALHANDO SÉRIO A GENTE CHEGA LÁ



PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

CANAL DO SERTÃO ALAGOANO – Trecho 05

Novembro/2017



Providências tomadas pelo Governo do Estado de Alagoas

Ano 2016

- **Ofício nº 002/2016** - SEINFRA/GS - 04/01/2016 - Notificação emitida pela Seinfra/AL, para empresa contratada pela execução do Trecho 5 (Contrato nº 58/2010 CPL/AL), para repactuação do contrato, acerca da adequabilidade do projeto básico e dos quantitativos e serviços da planilha orçamentária.
- **Ofício nº 339/2016** - SEINFRA/GS – 06/05/2016 – Seinfra/AL encaminha ofício ao TCU, como resposta ao Ofício nº 167/2016 – TCU, onde se manifesta a respeito da execução do Estudo da Viabilidade Técnica Econômica do contrato nº 58/2010 CPL/AL do Trecho 5.



Providências tomadas pelo Governo do Estado de Alagoas

Ano 2016

- **Ofício nº 417/2016** - SEINFRA/GS – 20/06/2016, A Seinfra/AL encaminhou ao TCU o Relatório de Estudos de Viabilidade Técnica do Trecho 5, onde a planilha contratual original atualizada no valor de **R\$ 686.325.945,46**, foi revisada e os preços repactuados, passando o contrato para o valor de **R\$ 559.655.655,19**, representando uma economia ao erário publico de 18,46%, neste ofício anexou-se o Ofício nº007/2016 CQG/CS – 16/06/2016 da Construtora Queiroz Galvão onde a mesma concorda com a repactuação de referido contrato.
- **Ofício nº 742/2016** – SEINFRA/GS – 01/12/2016 – Apresentação junto ao TCU – Esclarecimento do EVTE – Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica elaborado como proposta para repactuação do Contrato nº 58/2010, onde verificou-se a existência de sobrepreços que foram retirado das horas “in itinere” , passando o valor do contrato revisado para **R\$ 527.637.176,21**.



Deliberações tomadas pelo Governo do Estado de Alagoas Ano 2016

- **Ofício nº 812/2016** - SEINFRA/GS de 30/12/2016 – A Seinfra/AL, esclareceu ao TCU as informações do EVTE - Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica, solicitando a repactuação do contrato nº 58/2010 CPL/AL e a possibilidade de início imediato do início das obras com as soluções técnicas adequadas, menores prazos e custos para o Estado de Alagoas.



Providências tomadas pelo Governo do Estado de Alagoas

Ano 2017

- **Ofício nº 583/2017** – SEINFRA/AL- GS – 13/09/2017 – Manifestação quanto a deliberação da unidade técnica da SeinfraCOM, prolatada em 29/06/2017, ressaltando através do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica em atendimento ao determinado pelos Acórdãos, que não houve vícios ou graves falhas no projeto básico original, que pudessem ensejar a anulação do certame e a contratação do projeto básico original o qual continha plena viabilidade técnica, não havendo transfiguração do objeto contratual.



Providências tomadas pelo Governo do Estado de Alagoas Ano 2017


IMPORTANTE

- Conforme descrito no Relatório de Auditoria emitido pelo TCU (Apenso 006.327/2013-3 - TC 003.632/2015-6), identificou-se no valor revisado da Opção B (R\$ 527.637.176,21) a existência de um **subpreço de 1,99%** com relação ao valor adotado pela SeinfraHidroFerrovia.





**CANAL ADUTOR
DO SERTÃO ALAGOANO**

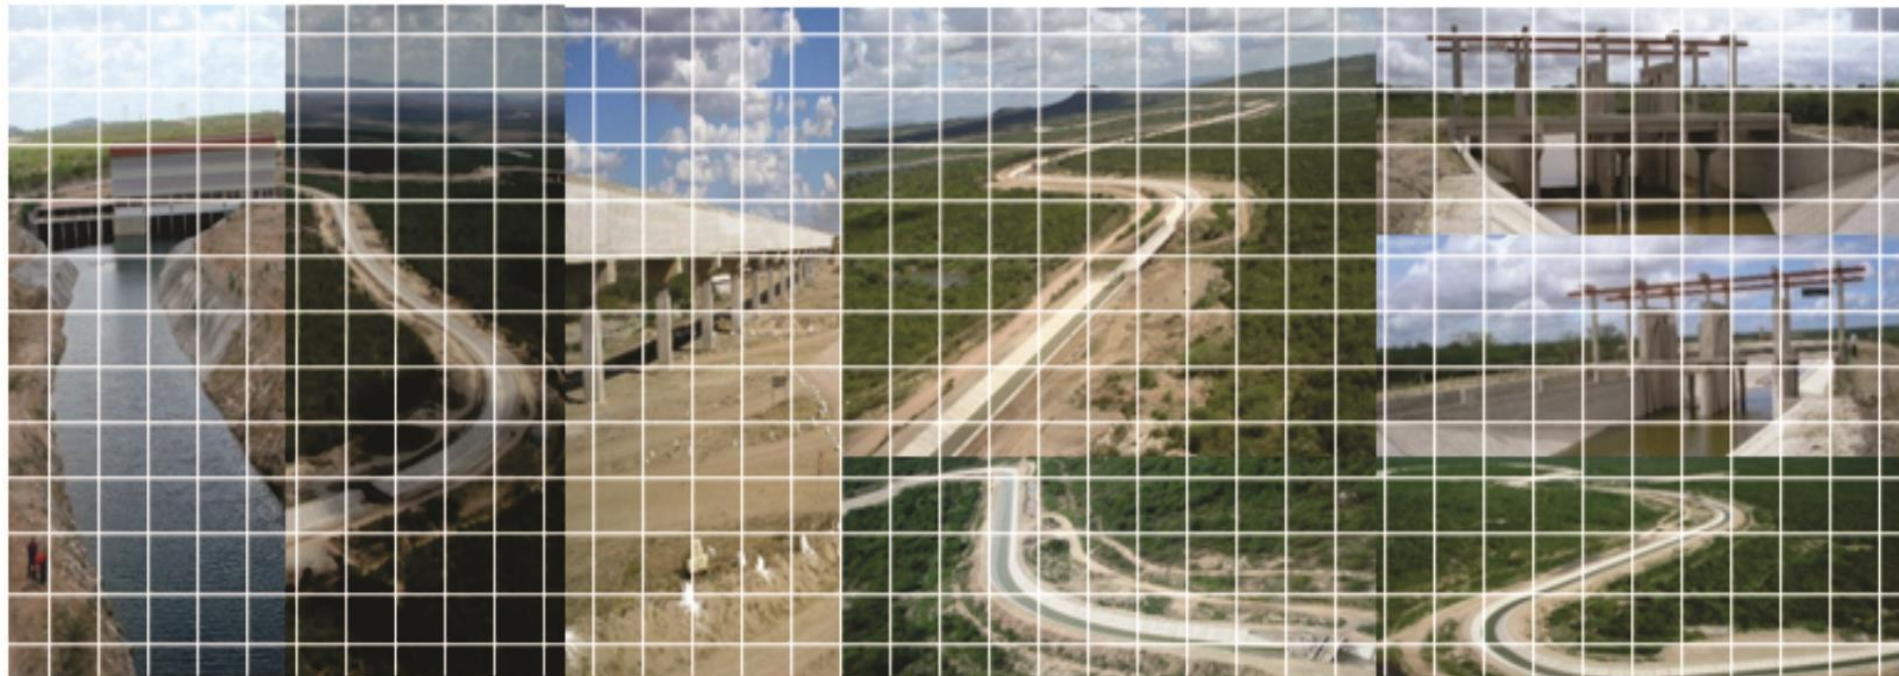

AGRADECEMOS À ATENÇÃO!



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
